


Projekt-Zeitplanung

Erstellt am: 14.1.2026

Zeitraum: 2 Jahre (Jan. 2026 - Dez. 2027)



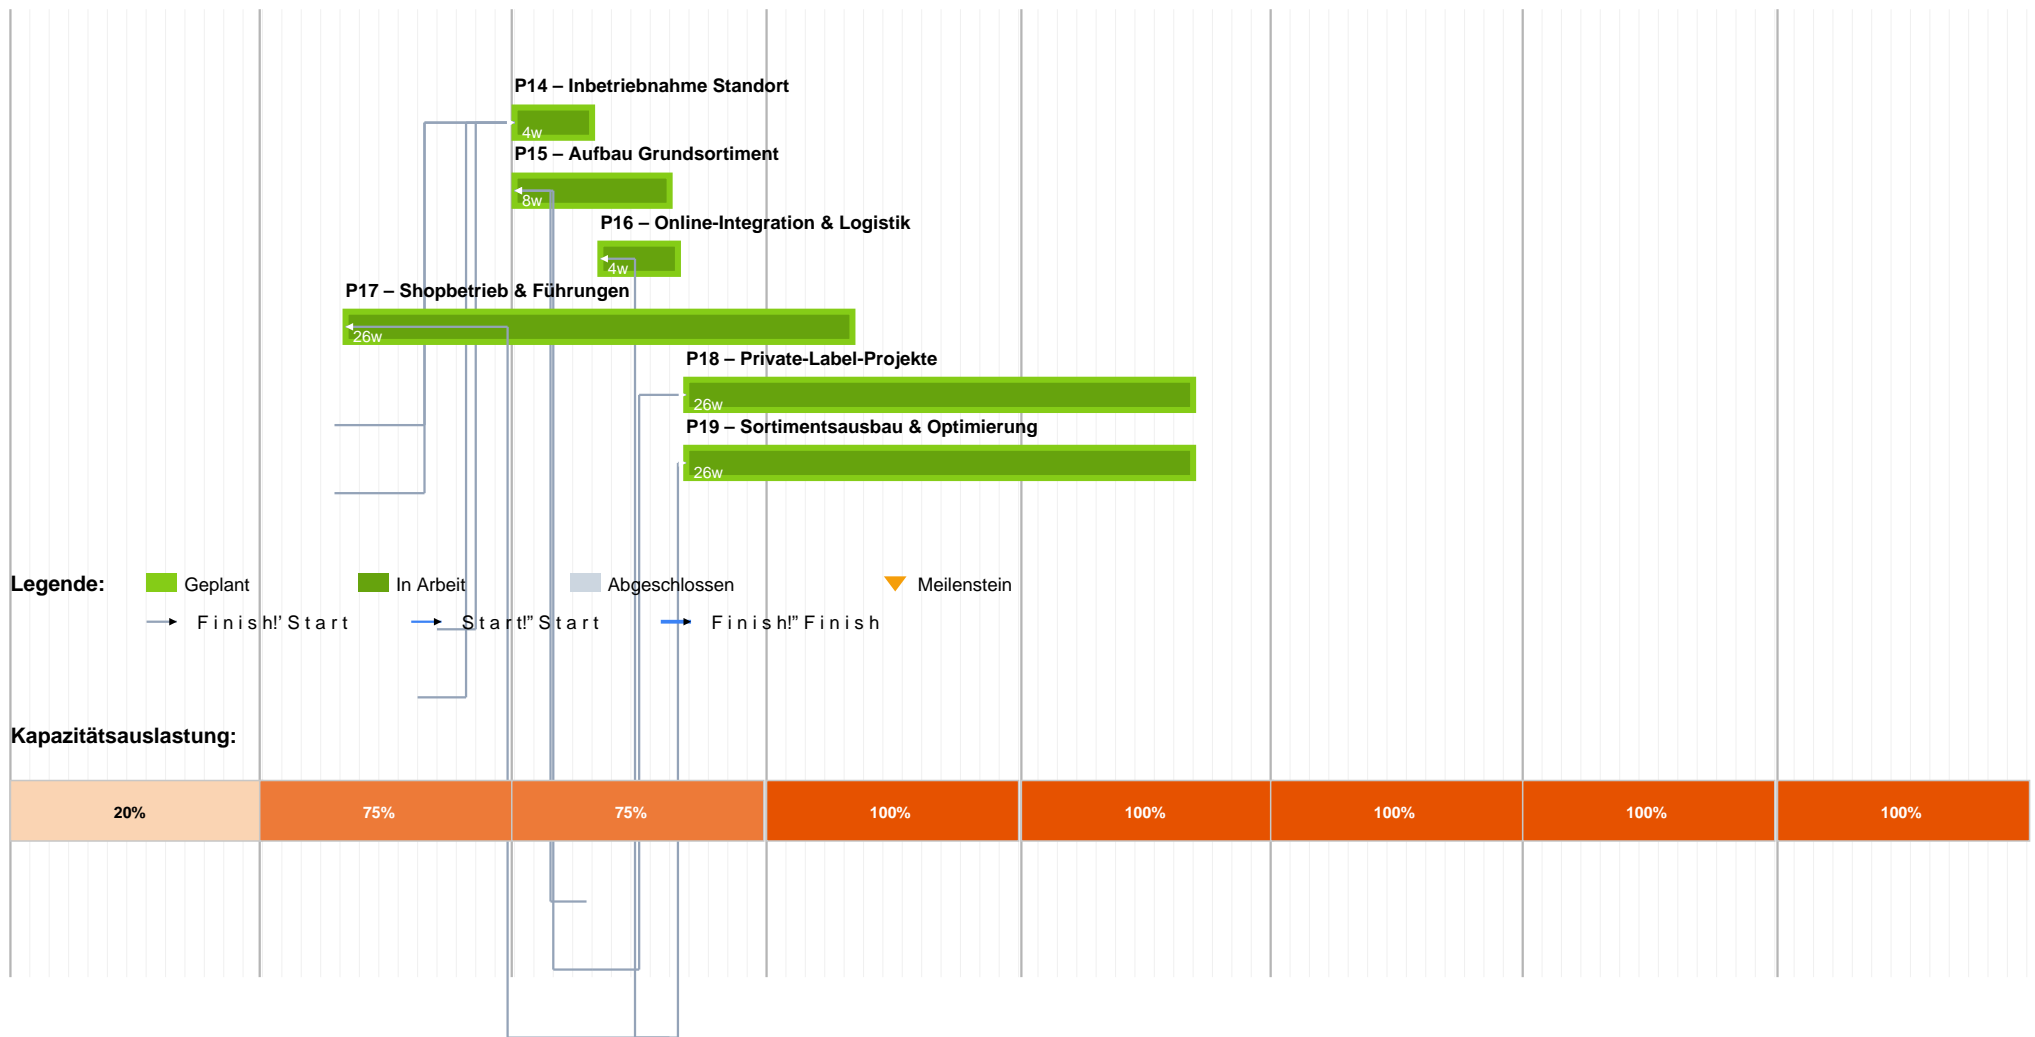

Projekt-Details

1. P1 - Projektinitialisierung & Grobkonzept

Status: In Arbeit

Zeitraum: 7.1.2026 - 4.2.2026 (4 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Definition Projektumfang, Zielbild Standort 2, Funktionszonen (Produktion, Lager, Shop, Online, Entwicklung), erste Zeit- und Ressourcenlogik.

2. P2 – Objektprüfung & Eignungsanalyse

Status: In Arbeit

Zeitraum: 10.1.2026 - 7.2.2026 (4 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Prüfung vorhandenes Objekt hinsichtlich:

Lebensmittelrecht

Alkoholherstellung & Lagerung

Verkehrsflächen, Trennung Produktion/Lager/Shop

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P1 - Projektinitialisierung & Grobkonzept"

3. P3 – Behörden-Vorabklärung Lebensmittel

Status: In Arbeit

Zeitraum: 15.1.2026 - 12.2.2026 (4 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Betriebsstättenbesichtigung mit Lebensmittelbehörde, Klärung Auflagen, Umbauanforderungen, Genehmigungsweg.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P2 – Objektprüfung & Eignungsanalyse"

4. P4 – Vorabklärung Steuerlager / Zoll

Status: In Arbeit

Zeitraum: 15.1.2026 - 12.2.2026 (4 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Kontaktaufnahme Zoll, Klärung:

Steuerlagerfähigkeit Objekt

Meldepflichten

organisatorische Voraussetzungen

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P2 – Objektprüfung & Eignungsanalyse"

5. P5 – Standortentscheidung & Mietverhandlung

Status: In Arbeit

Zeitraum: 9.2.2026 - 9.3.2026 (4 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Finale Entscheidung Objekt, Mietkonditionen, Vertragsabschluss oder Absage.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P3 – Behörden-Vorabklärung Lebensmittel"

! Start nach Ende von "P4 – Vorabklärung Steuerlager / Zoll"

6. P6 – Genehmigungsverfahren Betriebsstätte

Status: In Arbeit

Zeitraum: 2.3.2026 - 27.4.2026 (8 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Formale Einreichungen, Abstimmung Umbauten, Auflagenumsetzung.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P5 – Standortentscheidung & Mietverhandlung"

7. P7 – Genehmigung Steuerlager

Status: In Arbeit

Zeitraum: 2.3.2026 - 27.4.2026 (8 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Einreichung Steuerlager, Definition Prozesse, Sicherungs- & Dokumentationskonzept.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P5 – Standortentscheidung & Mietverhandlung"

8. P8 – Raumplanung & Layout

Status: In Arbeit

Zeitraum: 16.3.2026 - 13.4.2026 (4 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Detailplanung:
Produktionsfluss
Lagerzonen
Packraum
Shopfläche

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P5 – Standortentscheidung & Mietverhandlung"

9. P9 – Beschaffung Ausstattung Produktion & Lager

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.4.2026 - 3.6.2026 (9 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Anschaffung:

Abfülltechnik

Lagereinrichtung

Sicherheits- & Messsysteme

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P8 – Raumplanung & Layout"

10. P10 – IT, Doku- & Meldesysteme

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.4.2026 - 27.5.2026 (8 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Einrichtung:

Warenwirtschaft

Chargenrückverfolgung

Zoll- & Behördenmeldungen

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P7 – Genehmigung Steuerlager"

11. P11 – Produktentwicklung Kleinserie

Status: In Arbeit

Zeitraum: 7.1.2026 - 1.7.2026 (25 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Rezepturenentwicklung, Rohstoffdefinition, Pilotansätze.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P1 - Projektinitialisierung & Grobkonzept"

12. P12 – Verpackung & Etiketten

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.4.2026 - 1.7.2026 (13 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Design, rechtliche Prüfung, Druckfreigaben.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P11 – Produktentwicklung Kleinserie"

13. P13 – Pilotproduktion & Testläufe

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.6.2026 - 27.7.2026 (8 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Testabfüllungen, Prozessstabilisierung, Qualitätsfreigaben.

Abhängigkeiten:

- ! Start nach Ende von "P6 – Genehmigungsverfahren Betriebsstätte"
- ! Start nach Ende von "P9 – Beschaffung Ausstattung Produktion & Lager"
- ! Start nach Ende von "P11 – Produktentwicklung Kleinserie"

14. P14 – Inbetriebnahme Standort

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.7.2026 - 29.7.2026 (4 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Übergang vom Projekt in den laufenden Betrieb, finale Behördenabnahmen.

Abhängigkeiten:

- ! Start nach Ende von "P6 – Genehmigungsverfahren Betriebsstätte"
- ! Start nach Ende von "P7 – Genehmigung Steuerlager"
- ! Start nach Ende von "P9 – Beschaffung Ausstattung Produktion & Lager"
- ! Start nach Ende von "P10 – IT, Doku- & Meldesysteme"

15. P15 – Aufbau Grundsortiment

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.7.2026 - 26.8.2026 (8 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Produktion lagerfähiger Kleinserien für Shop & Online.

Abhängigkeiten:

- ! Start nach Ende von "P13 – Pilotproduktion & Testläufe"
- ! Start nach Ende von "P14 – Inbetriebnahme Standort"

16. P16 – Online-Integration & Logistik

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.8.2026 - 29.8.2026 (4 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Produktanlage, Versandlogik, Packprozesse.

Abhängigkeiten:

- ! Start nach Ende von "P15 – Aufbau Grundsortiment"

17. P17 – Shopbetrieb & Führungen

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.5.2026 - 30.10.2026 (26 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Betrieb Shop mit Grundsortiment, Nutzung für Führungen.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P15 – Aufbau Grundsortiment"

18. P18 – Private-Label-Projekte

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.9.2026 - 2.3.2027 (26 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Abwicklung externer Anfragen, Kleinserien B2B, Saisonspecials Weihnachten.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P14 – Inbetriebnahme Standort"

19. P19 – Sortimentsausbau & Optimierung

Status: In Arbeit

Zeitraum: 1.9.2026 - 2.3.2027 (26 Wochen)

Fortschritt: 0%

Beschreibung:

Neue Rezepturen, Effizienzsteigerung, Skalierung.

Abhängigkeiten:

! Start nach Ende von "P15 – Aufbau Grundsortiment"
